



Regulador y Supervisor Financiero de Chile

## **Sesión N°28 Grupo Consultivo Foro del Sistema de Finanzas Abiertas (FSFA)**

**Comisión para el Mercado Financiero**  
Mayo 2025

# Agenda

01

Presentación Propuesta Trabajo Foro 2025 (EdS)

02

Comentarios miembros GC

# Agenda

01

Presentación Propuesta Trabajo Foro 2025 (EdS)

02

Comentarios miembros GC

# Propuesta Fase 3 Grupos Técnicos Finanzas Abiertas

Equipo Escuela Negocios UAI

# Contenidos



1. Antecedentes: etapas apoyo y estado avance
2. Alcance Fase 3
3. Plan de trabajo Fase 3

# 1. Antecedentes



MARZO 2024

ABRIL - MAYO 2024

MAYO 24 – MARZO 2025

ABRIL 25 – SEPTIEMBRE 25

## Kick off

- ✓ Preparación, firma contratos
- ✓ Norma en consulta CMF

## Fase #1:

### Diagnóstico, Plan de Trabajo inicial y piloto

- ✓ Ronda de reuniones con firmantes y CMF.
- ✓ Revisión y priorización temas GT.
- ✓ Piloto con 3 GT para evaluar metodología.
- ✓ Entregables: (i) propuesta metodología de trabajo (plan inicial), y (ii) matriz de priorización de temas, y (iii) plan de trabajo detallado de cada GT con **enfoque por etapas**.

## Fase #2:

### Primer Ciclo Soporte

- ✓ Metodología: talleres, ciclo de reuniones (con diversas formas de trabajo), propuestas del EdS, encuestas y PoC portal desarrollador.
- ✓ Mejora continua: en base a lecciones aprendidas de cada etapa.
- ✓ Entregables: información pública, temas transversales, flujo de información PN y PJ.
- ✓ Se realizaron las reuniones correspondientes a la iniciación de pagos, con un alcance reducido.
- ✓ Cierre de temas pendientes del entregable 3.
- ✓ Se traspasará la información necesaria a la CMF para no impactar el trabajo de iniciación de pagos.


## Fase #3:

### Segundo Ciclo Soporte

- ✓ Ronda de reuniones con firmantes y CMF.
- ✓ Propuesta de trabajo.
- Entregable 4 (iniciación de pagos) con alcance según indique la CMF.
- Responder a consultas de la CMF para la elaboración de la norma en consulta.
- Versión 1.0 de diagramas de flujo y requerimientos técnicos (base portal del desarrollador).

- ✓ Actividad completada
- Actividad en desarrollo
- Actividad no iniciada

# Se distribuyó entregable Etapa 3.5 al GC

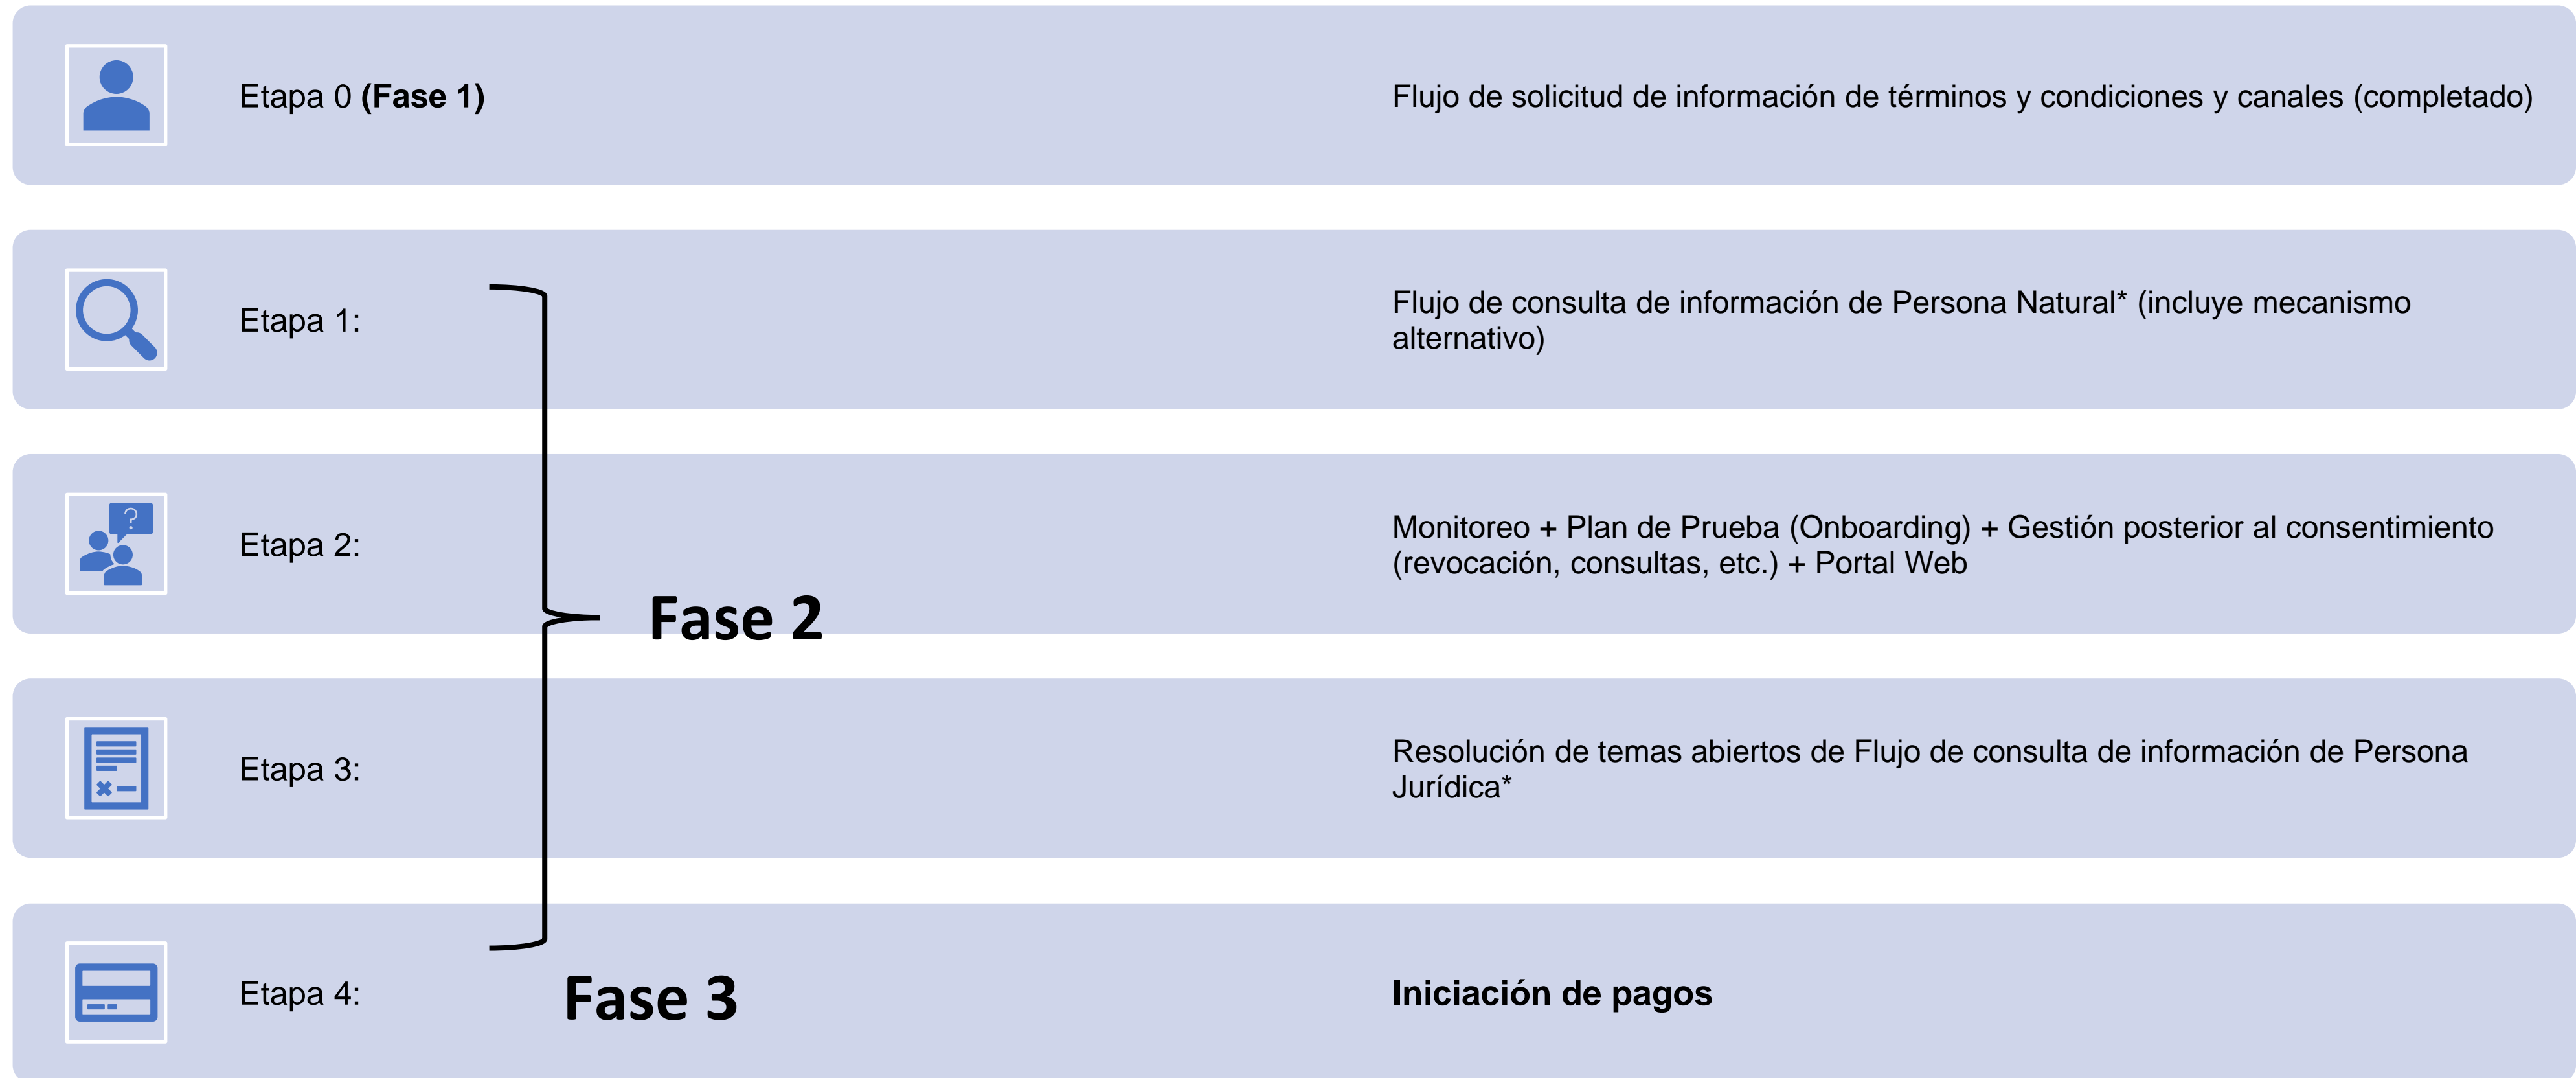

\* Información para Bancos, Emisores de tarjetas de pago y otros proveedores de cuenta

## 2. Alcance Fase 3

- La propuesta se realiza en base a los siguientes **insumos**:
  - **Temario original** de la Etapa 4 (trabajado inicialmente en febrero y marzo)
  - **Retroalimentación de los gremios y Banco Estado** (se ajustó la propuesta inicial de composición de los GT para las reuniones, optando por algo más similar a lo trabajado en las etapas anteriores)
  - **Reuniones con la CMF** (inclusión de puntos específicos sobre los cuales la CMF estima quiere información para elaborar el Anexo 3)
- Con todo, se generaron **3 líneas de trabajo** para iniciación de pagos:
  - **Reuniones extraordinarias** en las cuales se abordarán los temas específicos levantados por la CMF en las reuniones bilaterales.
  - **Reuniones ordinarias** de los GT para continuar con el temario:
    - Primera etapa con caso de uso base o MVP (Entregable 4)
    - Segunda etapa con casos de uso más complejos (Entregable 4.5)
  - **Diagramas de secuencia** que complementan el documento (base para portal del desarrollador)
- El EdS tendrá además **reuniones periódicas con la CMF** para seguimiento de temas y aclarar dudas.





# 3. Plan de trabajo Fase 3

- El plan de trabajo se divide en **tres ciclos**:
  - **Reuniones extraordinarias**: tienen por objetivo entregar insumos a los procesos internos de la CMF. Estas reuniones ayudarán además a refinar el temario de los GT, en especial el último ciclo.
    - Se elaborarán minutas de estas reuniones para entrega a la CMF.
  - **Etapas 4**: reuniones de los GT para completar los insumos para el caso de uso base o MVP (transferencia electrónica de fondos, instantánea, 1-a-1 y en moneda nacional entre PN y/o PJ).
    - En paralelo se desarrollarán los diagramas de flujo correspondientes al MVP.
  - **Etapas 4.5**: reuniones de los GT para completar los insumos para los casos de uso más complejos que serán levantados y priorizados por la CMF en base a los insumos de las reuniones extraordinarias.
- **Nota sobre el alcance**: El EdS propone dejar fuera la discusión, por considerar que ya se le han entregado los insumos necesarios a la CMF o que escapan del alcance que el Foro ha definido para los GT:
  - **Mecanismo alternativo**: CMF hizo entrega de lineamiento y fueron discutidos ampliamente, pudiendo abordarse en la etapa de consulta del Anexo 3.
  - **Marcha blanca** : fuera de Anexo 3 y se discutió ampliamente en etapas anteriores.
  - **Estructura de costos**: Anexo 4.

# 3. Plan de trabajo Fase 3

- Reuniones extraordinarias:
  - Se realizarán dos reuniones para tratar los siguientes temas:
    - Levantamiento de casos de uso más complejos y consideraciones técnicas de estos
    - Aspectos que fomenten el uso de iniciación de pagos en el SFA
    - Consistencia con estructuras de poderes societarios.
  - El EdS elaborará minutas que servirán de insumo para la CMF y aporatrará para estructurar el temario de la Etapa 4.5.

		Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4							
		12-05-25	13-05-25	14-05-25	15-05-25	16-05-25	19-05-25	20-05-25	21-05-25	22-05-25	23-05-25	26-05-25	27-05-25	28-05-25	29-05-25	30-05-25	02-06-25	03-06-25	04-06-25	05-06-25	06-06-25
Reuniones	UAI y Gremios																				
Preparación reuniones	Gremios																				
Elaboración minutas	UAI																				
Revisión CMF	CMF																				

-  Trabajo a desarrollar por equipo UAI
-  Trabajo a desarrollar por gremios
-  Trabajo a desarrollar por CMF
-  Reunión remota

# 3. Plan de trabajo Fase 3

- Reuniones ordinarias GT (Etapa 4):
  - Se propone mantener el esquema de reuniones de los GT, utilizando las revisiones cruzadas para asegurar la consistencia de las decisiones.
  - Se hará una reunión final en donde se revisarán los diagramas de secuencia trabajados de manera asíncrona.
  - Se elaborará el Entregable 4 (entrega el 24 de julio y comentarios del GC el 7 de agosto).

		Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11				
		02-06-25	03-06-25	04-06-25	05-06-25	06-06-25	09-06-25	10-06-25	11-06-25	12-06-25	13-06-25	16-06-25	17-06-25	18-06-25	19-06-25	20-06-25	23-06-25	24-06-25	25-06-25	26-06-25	27-06-25	30-06-25	01-07-25	02-07-25	03-07-25	04-07-25	07-07-25	08-07-25	09-07-25	10-07-25	11-07-25	14-07-25	15-07-25	16-07-25	17-07-25	18-07-25	21-07-25	22-07-25	23-07-25	24-07-25	25-07-25
Reuniones GT APIs	UAI y Gremios			■					■					■																											
Reuniones GT Infraestructura	UAI y Gremios								■																																
Reuniones GT UX	UAI y Gremios			■										■					■																						
Cierre de diagramas de secuencia	UAI y Gremios																								■																
Preparación reuniones	Gremios	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elaboración propuesta UAI	UAI																									■	■	■	■	■	■										
Reunión Cierre Grupos Técnicos	UAI y Gremios																																								
Elaboración Especificaciones Técnicas	Gremios																																								

- Trabajo a desarrollar por equipo UAI
- Trabajo a desarrollar por gremios
- Elaboración Entregable
- Reunión remota
- Reunión de cierre de diagramas de secuencia

# 3. Plan de trabajo Fase 3

- Reuniones ordinarias GT (Etapa 4.5):
  - El temario de esta etapa se elaborará en base a tres insumos:
    - Temas que no se pudieron cerrar de la Etapa 4.
    - Casos de uso más complejos que el MVP que ya se discutieron parcialmente en febrero y marzo (por ejemplo pagos batch).
    - Casos de uso más complejos levantados en las reuniones extraordinarias.
  - Se elaborará el Entregable 4.5
    - La fecha límite de entrega es el 25 de septiembre (comentarios GC el 9 de octubre), pero dependiendo del alcance de la etapa 4.5 podría ser antes.



CRECERT

# Agenda

01

Presentación Propuesta Trabajo Foro 2025 (EdS)

02

Comentarios miembros GC



Regulador y Supervisor Financiero de Chile

## **Sesión N°28 Grupo Consultivo Foro del Sistema de Finanzas Abiertas (FSFA)**

**Comisión para el Mercado Financiero**  
Mayo 2025
